

Protokół odbioru robót

sporządzony wInowrocław....., dnia24-08-2018..... roku w sprawie odbioru robót wykonanych przezP.R.D. INODROG Sp. z o.o..... na odcinku remontu ul. ... Andrzeja i NMP..... w ...Inowrocławiu.....na podstawie umowy nr ..ZZP.272..28.2018..... z dnia ..27.03.2018...

Komisja odbioru Zamawiającego w składzie:

1.Agnieszka Filipiak - UMI.....
2.Ryszard Radzikowski - UMI.....
3.Kamil Bogdanowicz - UMI
4.Urszula Marczevska – UMI.....
5.Katarzyna Bachorska - UMI.....
6.Tomasz Płotkowiak - UMI.....
7.Agnieszka Antczak - PWIK.....

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

1.mgr inż. Marcin Mozgowiec
2.inż. bud. Katarzyna Grosman.....

oraz w obecności inspektora nadzoru:inż. Marcin Młodziankiewicz.....

przeprowadziła w dniu ..24-08-2018.. roku, (zgłoszony przez Wykonawcę pisemnie —ustnie w dniu16-08-2018.....), końcowy odbiór **Przedmiotu umowy**.

Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami Komisja stwierdza co następuje:

1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym dobrze / ~~źle*~~, z usterkami wymienionymi w załączniku nr ...1.... , które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia...15-09-2018... .
2. Roboty rozpoczęto dnia ...05-04-2018.... zakończono dnia16-08-2018.... . Termin wykonania robót został dotrzymany / ~~przekroczony*~~ o dni z powodu

Komisja postanowiła:

1. Uznać roboty za wykonane i gotowe do odbioru

z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi.

2. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem(60 miesięcy)...2023-08-24.....

Zastrzeżenia i uwagi Komisji:

.....Zgodnie z załącznikiem nr 1 z dnia 24-08-2018.....

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.

Podpisy:

I. Członkowie Komisji:

- 1 ~~Agnieszka Filipiak~~ ~~Ryszard Góralowski~~
- 2 ~~Kamil Bogdanowicz~~ ~~PODSPEKTOR~~
~~w Referacie Dróg~~
- 3 ~~REFERENT~~
~~na Biuro Budowlane~~ ~~Grzegorz Mironczak~~
- 4 ~~KIEROWNIK~~
~~Referatu Gospodarki Komunalnej~~ ~~Stadowniska i Rolnictwa~~
- 5 ~~INSPEKTOR NADZORU~~
~~ds. drogowych~~ ~~Działu Sieci Wod. Kan.~~
- 7 ~~Inż. inż. Tomasz Foltkowiak~~ ~~Inż. inż. Agnieszka Antczak~~
Upr. Nr UAN-KZ-7210/274185

Dostarczona przez wykonawcę dokumentacja:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. Przedstawiciele Wykonawcy:

- 1 ~~mgr inż. Marcin Mozgowiec~~
- 2 ~~Groszmann~~
- 3

III. Inspektor Nadzoru:

~~mgr inż. Tomasz Foltkowiak~~
Upr. Nr UAN-KZ-7210/274185
Kierownik Biura Budowlanego
z udzieleniem uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Przebieg: KUP/0141/OWOK/04
tel. 0800-311-254

EWA WITKOWSKA

Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

ZATWIERDZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 24-08-2018

Komisja odbioru Zamawiającego w składzie:

1.Agnieszka Filipiak - UMI.....
2.Ryszard Radzikowski - UMI.....
3.Kamil Bogdanowicz - UMI
4.Urszula Marczevska – UMI.....
5.Katarzyna Bachorska - UMI.....
6.Tomasz Płotkowiak - UMI.....
7.Agnieszka Antczak - PWIK.....

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

1.mgr inż. Marcin Mozgowiec
2.
3.

oraz w obecności inspektora nadzoru:inż. Marcin Młodziankiewicz.....


1. Na wysokości sklepu Miła wymienić kostki na wjeździe o przekładce (są pomalowane)



2. Kostki ciemniejsze na głównym wejściu MILI do wymiany



3. Za Miłą kostki po przekładce do wymiany

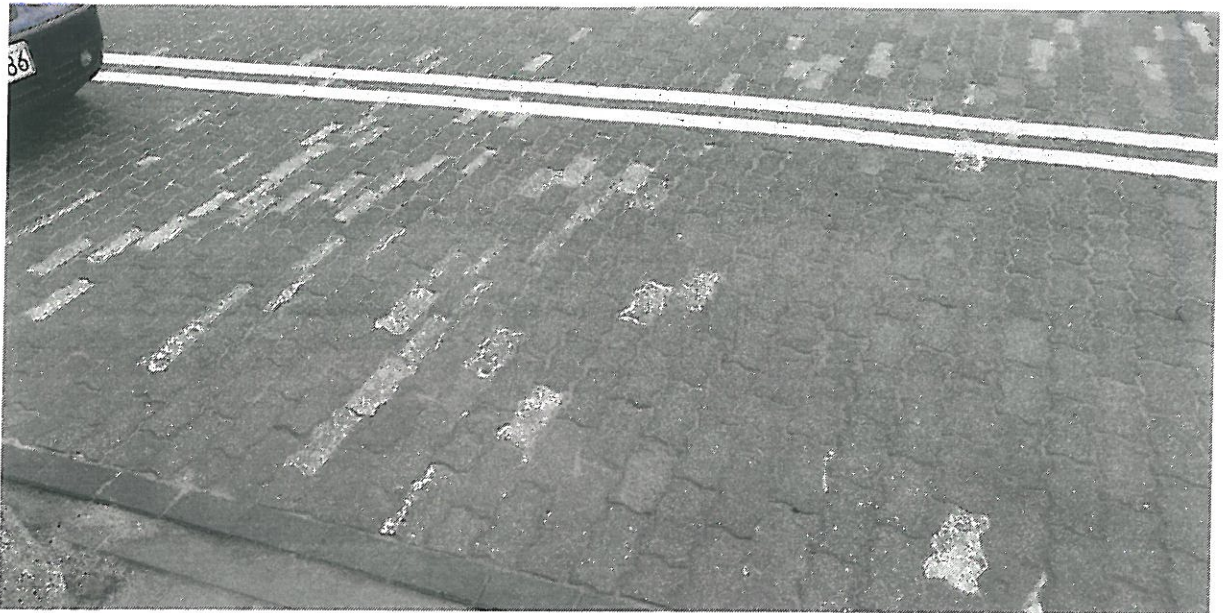

4. Oczyszczyć ubrudzenia po emulsji asfaltowej – uwaga ogólna



5. Na wysokości Rea fryzjer przekładki z pomalowanych kostek



6. Uszkodzony narożnik kostki ciemnej na łuku



7. Wystający beton przy znaku drogowym do poprawy



8. Przejście przez pasy na Andrzeja 29 za wysoki krawężnik

9. Andrzeja 35 obniżenie progów drzwi do kamienicy – uwaga do wyjaśnienia



10. Andrzejka 35 kratka biała wentylacyjna w cokole budynku do podwyższenia kostka czerwona do wymiany




11. Stalowy wystający dwuteownik w chodniku do usunięcia



12. Na wysokości kwiaciarni kamień graniczny wystający do obniżenia przy bramie



13. Przejście dla pieszych do obniżenia krawężnik

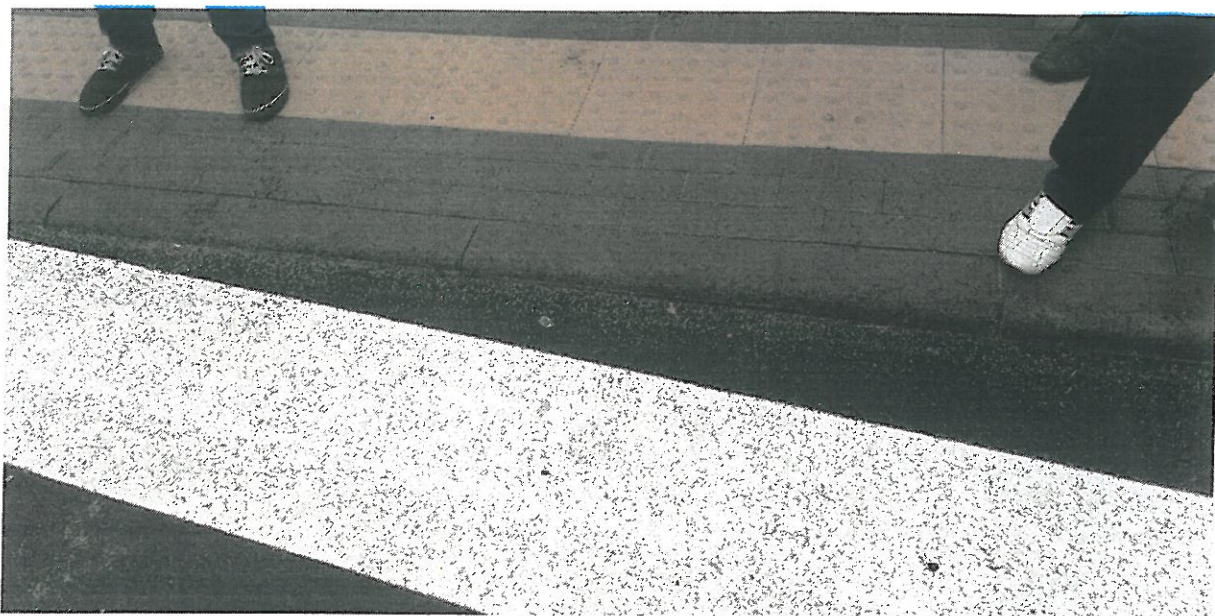

14. Scałić kostkę kolorystycznie w obrębie przystanku przy Andrzeja 38 – do wyjaśnienia



15. Podjazd betonowy dla niepełnosprawnych do poprawy – rozkruszył się



16. Scałić kolorystycznie kostki przy ul. Andrzeja 34 – do wyjaśnienia



17. Podjazd w kierunku ostatniej klatki schodowej – skruszył się



18. Wypełnić (zamulić) kostki



19. Prace na skrzyżowaniu do zakończenia Ducha – z NMP

20. Scałić kolorystycznie kostki na NMP

21. Naświetla piwniczne do regulacji przykręcić wg starego wzoru



22. Przejście dla pieszych naprzeciwko szkoły do poprawy wysokość kostki



23. Skos zjazdu do wyprofilowania



24. Przejście dla pieszych na NMP do szkoły obniżyć krawężnik



25. Na skrzyżowaniu NMP i św. Ducha

26. Przy studzience telekomunikacyjnej w narożu uzupełnić kostkę




27. Do obniżenia krawężniki na skrzyżowaniu naprzeciwko kwaciarni



28. Do wyrównania kosatka na wjeździe do Orleń



29. Ciąg pieszy za Orleń łuki z krawężników na przejeździe do obniżenia

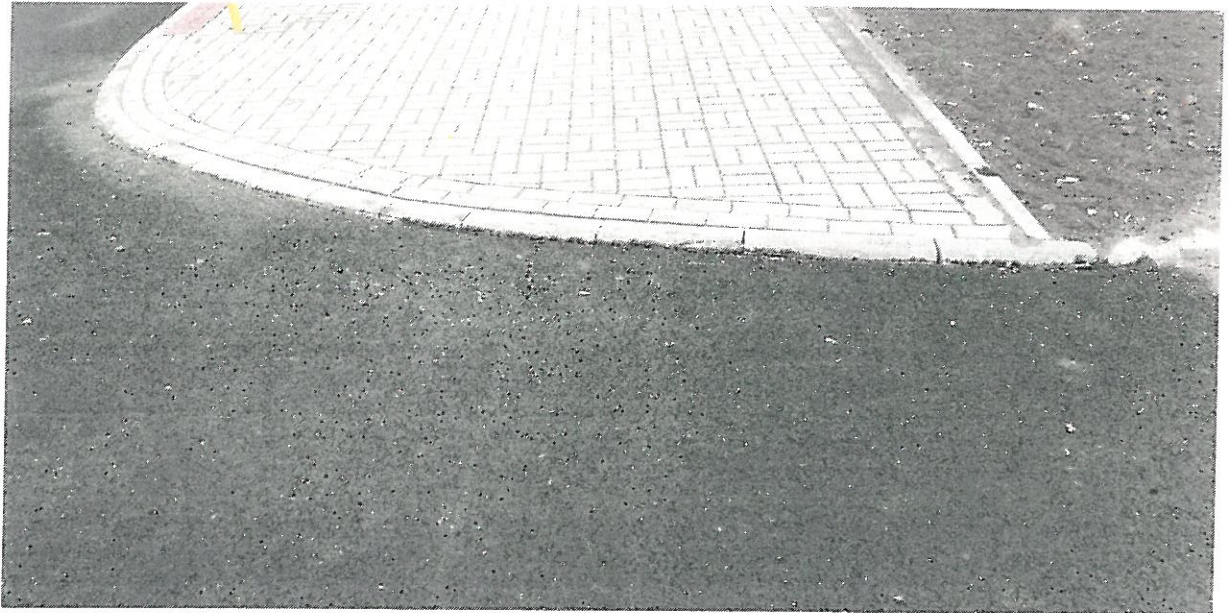

30. Zieleń – wałowanie

31. Uzupelnic o znak B-36 przy wlocie na Orleń

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.

Podpisy:

I. Członkowie Komisji:

- 1 *Ryszard Rogoziński*
- 2 *Kierownik Referatu Dróg* *Podinspektor w Referacie Dróg* *Kamil Bogdanowicz*
- 3 *Inspektor Nadzoru* *Referent w Referacie Dróg*
- 4 *Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej* *Naczelnik Srodowiska i Rolnictwa*
- 5 *Inspektor Nadzoru ds. dróg* *Niezwłocznie Działu Sieci Wod. Kan.*
- 6 *mgr inż. Tomasz Płociniczak* *mgr inż. Agnieszka Antczak*
- 7 *Upr. Nr UAN-KZ-7210/274/S*

II. Przedstawiciele Wykonawcy:

- 1 *mgr inż. Marcin Mozgowiec*
- 2 *Groszowski*
- 3

III. Inspektor Nadzoru:

inż. Waldemar Ziemierny Włodziankiewicz
 Upr. Nr UAN-KZ-7210/274/S
 Inspektor Nadzoru ds. drogowych
 Działu Sieci Wod. Kan.
 nr ewid.: KUP/0141/OWOK/04
 tel. 0603-311-254

Protokół usunięcia usterek

W dniu dzisiejszym stwierdzam, że usterki wyszczególnione w protokole odbioru z dnia 24-08-2018 zostały w całości usunięte przez wykonawcę, tj. firmę PRD INODROG sp. z o.o. Roboty uznaje się za odebrane w całości.

Podpisy:

I. Inspektor
2018-09-17
1. *[Signature]*
2.
nr awid.: KUP/0141/QWOK/.....
tel. 0000

II. Przedstawiciele Wykonawcy
2018-09-17
1. *[Signature]*
2.
KUP/0046/QWOD/08

Akceptacja / uwagi – pozostali członkowie komisji:

[Signature] Agnieszka Filipiak 2018-09-17
KIEROWNIK Referatu Dróg
Ryszard Radzikowski Kierownik Działu Sieci/Wod/Kan. *[Signature]* Marcin Juszak
POBINSPEKTOR w Referacie Dróg *[Signature]* Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
[Signature] *[Signature]*

Zatwierdzenie zamawiającego:

EWA WITKOŃSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
.....
K. Ur. Prezydenta Miasta
